



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY SR
PRE INVESTÍCIE
A INFORMATIZÁCIU



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020

Stav kontrahovania a čerpania PO7 OPII (ERDF)

Monitorovací výbor OPII, 17.06. – 18.06.2019, Martin



Obsah

1. Implementované projekty PO7 OPII

- a) Stav čerpania a kontrahovania PO7 OPII (ERDF)
- b) Kontrahované pred 6/2016
- c) Kontrahované po 6/2016

2. Pripravované projekty PO7 OPII

- a) V schvaľovacom procese Žiadosti o NFP a príprave zmluvy o poskytnutí NFP
- b) Vo fáze prípravy Žiadosti o NFP
- c) Schválené na RV v termíne 04/2019
- d) Schválené na RV v termíne 06/2019
- e) Sumár PO7 OPII



1a) Implementované projekty PO7 OPII
Stav čerpania a kontrahovania PO7 OPII (ERDF)

Celková alokácia PO 7 OP II (ERDF) 736 940 302,00 EUR (znížená o VR)

Kontrahovanie

Súčasnoscť:

317 810 809,35* = 43,13%

**Plán kumulatívneho kontrahovania do konca
roka 2019**

711 013 504,05 = 82,01 %

Čerpanie:

Súčasnoscť:

78 039 025,01* = 10,59 %

**Plán kumulatívneho čerpania do konca roka
2019**

107 754 912,76 = 14,62 %





1b) Implementované projekty PO7 OPPII Kontrahované pred 6/2016

	Názov	Prijímateľ	Dátum podpisu ZoNFP	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Kontrahovanie ERDF	Podiel ERDF	Aktuálne čerpanie ERDF
1	Register úpadcov - 2. fáza	MS SR	10.3.2016	4 421 505,00	3 329 083,76	75,293%	3 325 130,86
2	Register priestorových informácií - 2. fáza	MŽP SR	12.12.2016	2 578 912,00	1 941 740,21	75,293%	1 744 732,76
3	Digitálne učivo na dosah – 2. fáza	MŠ SR	11.12.2015	24 434 768,71	20 769 553,40	85,000%	16 316 109,51
4	Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru (RPESISPZ) - 2. fáza	MV SR	2.3.2016	550 800,00	414 713,84	75,293%	414 713,84
5	IS Identifikátora fyzických osôb- 2. fáza	MV SR	2.3.2016	704 002,18	530 064,36	75,293%	-
6	Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného zboru - 2. fáza	MV SR	2.3.2016	10 781 149,17	8 117 450,64	75,293%	8 117 450,64
7	Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza	MV SR	8.3.2016	3 710 472,39	2 793 725,98	75,293%	2 793 725,98
8	Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza	MS SR	14.3.2016	12 786 119,68	12 067 479,86	75,293%	9 604 907,89
9	Elektronické služby MH SR - 2. fáza	MH SR	11.3.2016	1 173 390,99	883 481,28	75,293%	877 491,90
10	Cloud Ministerstva vnútra SR	MV SR	10.3.2016	41 078 084,86	34 704 714,81	84,485%	34 225 555,91
11	Datacentrum Ministerstva vnútra SR	MV SR	25.5.2016	30 891 828,84	26 258 054,51	85,000%	-
12	Elektronický archív MV SR	MS SR	24.3.2016	822 394,80	619 205,72	75,293%	619 205,72
	Spolu			133 933 428,62	112 429 268,37		78 039 025,01

Ukončené projekty / Fyzicky ukončené projekty / Prebieha realizácia



1c) Implementované projekty PO7 OPPII

Kontrahované po 6/2016

	Názov	Prijímateľ	Dátum podpisu ZoNFP	Kontrahovanie (oprávnené výdavky)	Kontrahovanie ERDF	Aktuálny stav
1.	Informačný systém Obchodného registra SR	MS SR	15.2.2018	9 935 966,07	7 481 086,93	prebieha realizácia
2.	Centrálny ekonomický systém	MF SR	23.2.2018	48 184 180,74	32 142 703,29	prebieha realizácia
3.	Centrálny informačný systém štátnej služby	NASES	18.7.2018	4 902 568,00	3 270 405,06	prebieha realizácia
4.	Informačný systém Centra právnej pomoci (CPP)	CPP	5.9.2018	4 943 292,75	3 721 953,41	prebieha realizácia
5.	Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa	DEUS	8.10.2018	31 283 191,41	23 554 053,31	prebieha realizácia
6.	Efektívny manažment údajov v prostredí SP	SP	27.9.2018	4 971 150,00	3 742 927,97	prebieha realizácia
7.	Dátová integrácia: sprístupnenie údajovej základne VS	UPPVII	10.10.2018	15 578 250,72	11 729 332,31	prebieha realizácia
8.	Rozvoj platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment osobných údajov	UPPVII	26.11.2018	16 748 292,00	12 610 291,50	prebieha realizácia
9.	Zavedenie služieb Platform as a Service	MV SR	17.12.2018	18 955 494,60	14 272 160,55	prebieha realizácia
10.	Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy	NASES	11.2.2019	14 444 684,93	10 875 836,62	prebieha realizácia
11.	Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe	UPPVII	8.4.2019	44 960 647,00	33 852 219,95	prebieha realizácia
12.	Fáza 1: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020	MH SR	4.6. 2019	6 005 033,81	4 521 370,11	prebieha realizácia
13.	Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe	MV SR	4.6. 2019	36 378 945,68	24 267 667,08	prebieha realizácia
14.	Einklúzia prostredníctvom komplexného elektronického riešenia problematiky parkovania ťažko zdravotne postihnutých	DEUS	31.5.2019	9 133 014,62	6 876 520,70	prebieha realizácia
15.	Jednotný prístup k priestorovým údajom a službám – JPPÚS	MŽP SR	30.5.2019	9 663 685,29	6 446 451,18	prebieha realizácia
	Spolu			276 088 397,62	199 364 979,97	



2a) Pripravované projekty

V schvaľovacom procese Žiadosti o NFP a príprave zmluvy o poskytnutí NFP

	Názov projekt	Prijímateľ	NFP (oprávnené výdavky)	Zdroj ERDF	Písomné vyzvanie	ŽoNFP dátum predloženia	Aktuálny stav
1	Wifi pre Teba	Obce/ mestá	11 764 705,88	10 000 000	30.7.2018	prijatých 383 žiadostí	113 zmlúv o NFP, prebieha 4. kolo
2	Migrácia do Cloudu	OVM	13 281 447,15	10 000 000	2.7.2018	prijatých 7 žiadostí	2 hodnotiace kolá, predložených 7 žiadostí o NFP, z toho 1 zmluva o NFP
3	Manažment údajov inštitúcie verejnej správy	OVM	39 844 341,44	30 000 000	2.7.2018	prijatých 8 žiadostí	2 hodnotiace kolá, predložených 8 žiadostí o NFP, z toho 1 zmluva o NFP
4	Malé zlepšenia eGov služieb	OVM	26 562 894,29	20 000 000	2.7.2018	prijatých 0 žiadostí	za 2 hodnotiace kolá 0 predložených žiadostí
5	Digitálne pracovné prostredie zamestnanca MV SR	MV SR	19 438 675,24	12 967 151,48	9.10.2018	18.1.2019	Príprava zmluvy o NFP, príprava súťažných podkladov
6	Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ	MV SR	16 387 034,42	10 931 462,92	9.10.2018	18.1.2019	Príprava zmluvy o NFP, príprava súťažných podkladov
7	Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva	ÚVZ	17 980 412,11	11 994 373,31	19.11.2018	18.2.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
8	Elektronizácia služieb Národného inšpektorátu práce	NIP	5 774 023,04	3 851 735,29	29.11.2018	4.3.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov



2a) Pripravované projekty

V schvaľovacom procese Žiadosti o NFP a príprave zmluvy o poskytnutí NFP

	Názov projekt	Prijímateľ	NFP (oprávnené výdavky)	Zdroj ERDF	Písomné vyzvanie	ŽoNFP dátum predloženia	Aktuálny stav
9	Informačný systém Kancelárie Najvyššieho súdu	KNS	5 432 225,01	3 623 728,66	29.11.2018	4.3.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
10	Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže	ZVJS	23 748 264,00	17 880 780,41	15.2.2019	15.5.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
11	Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD)	UPREKAPS	9 321 024,91	7 018 079,29	11.2.2019	13.5.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
12	Projekt rozvoja IS elektronických služieb RÚ	UPREKAPS	4 608 144,77	3 469 610,44	23.1.2019	23.4.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
13	Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie zo strany MZ SR	MZ SR	1 532 522,04	1 153 881,82	23.1.2019	23.4.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
14	Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií	MV SR	4 560 154,11	3 433 476,83	8.2.2019	3.5.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
15	Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 –D)	NCZI	12 025 464,27	9 054 332,81	15.1.2019	15.4.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
16	Online procesy eZdravia	NCZI	7 491 951,39	5 640 914,96	19.2.2019	20.5.2019	prebieha hodnotenie, príprava súťažných podkladov
	Spolu		219 753 284	161 019 528			



2b) Pripravované projekty PO7 OPII Vo fáze prípravy Žiadosti o NFP

	Názov projektu	Prijímateľ	Alokácia (SPOLU)	Alokácia (ERDF)	Štúdia	Vyzvanie / Výzva	Deadline Žiadosť	Aktuálny stav
1.	Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA)	MF SR	5 038 375,00	3 360 999,20	11.10.2018	23.4.2019	25.7.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
2.	Systém verejného obstarávania	UVO	19 750 824,00	14 870 987,91	21.2.2019	8.4.2019	30.9.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
3.	Pamiatkový informačný systém	PÚ SR	12 497 915,00	9 410 055,14	21.2.2019	28.3.2019	2.7.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
4.	Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií - eSMART	UPPVII	8 441 935,48	6 356 186,48	21.2.2019	15.5.2019	16.8.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
5.	Register zbraní a streliva	MV SR	7 248 114,00	5 457 322,47	21.2.2019	26.3.2019	2.7.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
6.	Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez Open API)	ÚPPVII	7 467 922,82	5 622 823,13	21.2.2019	27.3.2019	2.7.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
7.	Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie	IŽP	8 733 367,00	6 575 614,02	21.2.2019	29.3.2019	2.7.2019	zverejnené vyzvanie, príprava žiadosti NFP
8	Redizajn siete GOVNET	NASES	7 242 056,45	4 831 031,02	11.10.2018	06/2019	-	Príprava zverejnenia vyzvania
	Spolu		76 420 509,75	56 485 019,37				



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SR
PRE INVESTÍCIE
A INFORMATIZÁCIU



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2c) Pripravované projekty PO7 OPII Schválené RV v termíne 04/2019

	Názov projektu	Prijímateľ	Alokácia (všetky zdroje)	Alokácia (ERDF)	Aktuálny stav
1.	Modernizácia dávkových agend SP (MODA SP)	SP	18 435 041,00	13 880 295,42	príprava vyzvania, predpoklad zverejnenia 6/2019
2.	Informačný systéme - Živnostenský register	MV SR	3 913 497,00	2 946 589,30	Vyzvanie zverejnené 26.5.2019
3.	Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR	MŠ SR	6 857 247,00	5 163 026,98	Vyzvanie zverejnené 20.06.2019
4.	Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory	UPPVII	4 232 243,00	2 823 244,66	Vyzvanie zverejnené 18.06.2019
5.	Fáza 2: IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020	MH SR	8 090 217,00	6 091 367,09	Vyzvanie zverejnené 18.06.2019
6.	Otvorené údaje 2.0 - Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov	UPVII	3 548 634,00	2 671 873,00	príprava vyzvania, predpoklad zverejnenia 6/2019
7.	Dopytové projekty - Manažment údajov inštitúcie VS 2	UPPVII	13 281 447,15	10 000 000,00	príprava HK a výzvy, mimoriadny MV 17.5.2019
8.	Dopytové projekty - Malé zlepšenia e-Gov služieb 2	UPPVII	13 281 447,15	10 000 000,00	príprava HK a výzvy, mimoriadny MV 17.5.2019
9.	Dopytové projekty - Migrácia údajov inštitúcie VS 2	UPPVII	13 281 447,15	10 000 000,00	príprava výzvy, úprava z dôvodu rozšírenia zoznamu žiadateľov
	Spolu		84 921 220,45	63 576 396,45	



2d) Pripravované projekty PO7 OPII RV v termíne 06/2019

	Názov projektu	Prijímateľ	Alokácia (všetky zdroje)	Alokácia (ERDF)	Aktuálny stav
1.	Centralizovaný systém súdneho riadenia	MS SR	11 889 981	8 952 323	Príprava vyzvania
2.	Konsolidovaná analytická vrstva verejnej správy	UPPVII	8 360 000	6 294 495	Príprava vyzvania
3.	Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva (NZIS), ESO2	MZ SR	9 343 764	7 035 201	Príprava vyzvania
4.	Jednotný informačný systém štatistických údajov	Štatistický úrad	10 090 306	7 597 294	Príprava vyzvania
5.	Atlas pasívnej infraštruktúry MŽP	MŽP SR/MDSR	18 186 306	13 693 015	Príprava vyzvania
6.	Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti	UPPVII	43 374 581	32 658 023	Príprava vyzvania
7.	Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	20 120 258	15 149 146	Príprava vyzvania
8.	ÚRPO Implementácia a integrácia podporného informačného systému (IS RPO) pre informatickú podporu výkonných procesov ÚRPO	MZ SR	6 300 160	4 743 579	Príprava vyzvania
9.	Zvýšenie dostupnosti eZdravia	MZ SR	48 109 246	36 222 895	Príprava vyzvania
10.	Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska	MV SR	39 618 016	29 829 593	Príprava vyzvania
	Spolu		215 392 618	162 175 564	



EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020



ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY SR
PRE INVESTÍCIE
A INFORMATIZÁCIU



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

2d) Pripravované projekty PO7 OPII

Informácia o dopytových výzvach v termíne 06/2019

	Názov projektu	Prijímateľ	Alokácia (všetky zdroje)	Alokácia (ERDF)	Aktuálny stav
12	Zvýšenie intenzity využívania služieb a vzdelávania sa v digitálnom prostredí znevýhodnenými skupinami občanov a podpora asistovaného života a telemedicíny	UPPVII	15 000 000	11 293 950	príprava HK a výzvy, MV 17.6.2019
13.	Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy	UPPVII	30 000 000	22 587 900	príprava HK a výzvy, MV 17.6.2019
14.	Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS VS	UPPVII	15 000 000	11 293 950	príprava HK a výzvy, MV 17.6.2019
	Spolu		60 000 000 EUR	45 175 800 EUR	

		EUR CELKOVO	EUR ERDF		
OPII v.4 - alokácia znížená o VR		988 892 925	736 940 302		
STAV	POČET	EUR CELKOVO	EUR ERDF	Kumulatívne kontrahovanie ERDF	zostatok v PO7 OPII po zakontrahovaní
Ukončený	9	65 972 838	52 044 812	52 044 812	684 895 490
Vecne ukončené zo strany P	1	41 182 644	34 758 995	86 803 807	650 136 495
Implementácia	17	276 792 400	199 895 044	286 698 851	450 241 451
Príprava Zmluvy o NFP	1	16 387 034	10 931 463	297 630 314	439 309 988
Hodnotené a rozhodnutia*	15	203 366 250	150 088 065	447 718 379	289 221 923
Príprava ŽoNFP	8	73 091 950	54 600 578	502 318 957	234 621 345
Schválená ŠU**	23	312 751 851	234 495 182	736 814 139	126 163
Príprava ŠU na RV júl/2019	2	72 109 246	54 293 215	791 107 354	-54 167 052
Pripravované projekty	26	408 914 293	307 883 839	*Dop.v. (Man., Lepsie, Migr.) pôvodná + nav.alokácia (3x10mil EUR), bez DC MV SR **Dop.v. (elnkl., Data, Cyber, Fondu MP, Mod.techn.)	
SPOLU (bez Pripravovaných)	76	1 061 654 213	791 107 354		





EURÓPSKA ÚNIA
Európske štrukturálne a investičné fondy
OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020




ÚRAD PODPREDESEDU VLÁDY SR
PRE INVESTÍCIE
A INFORMATIZÁCIU



MINISTERSTVO
DOPRAVY A VÝSTAVBY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY


Ďakujem za pozornosť

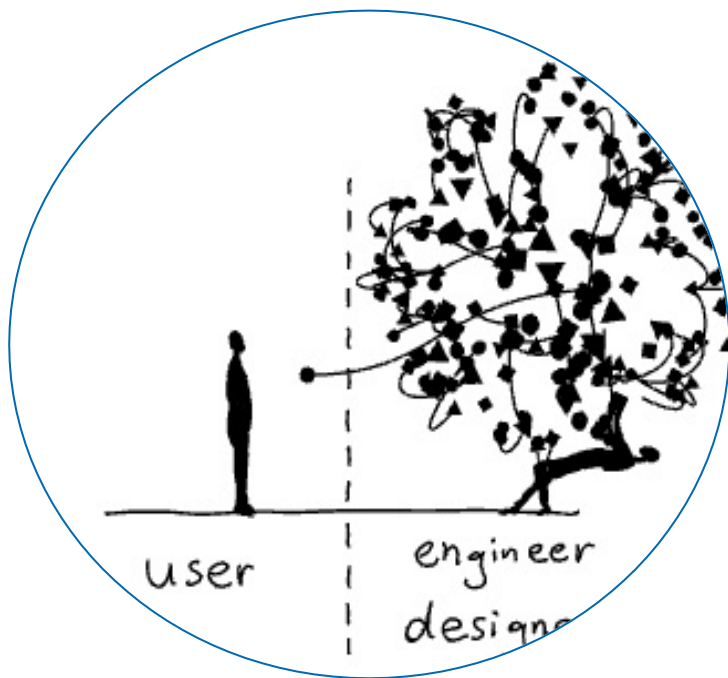

Sprístupnenie obsahu



Telemedicína

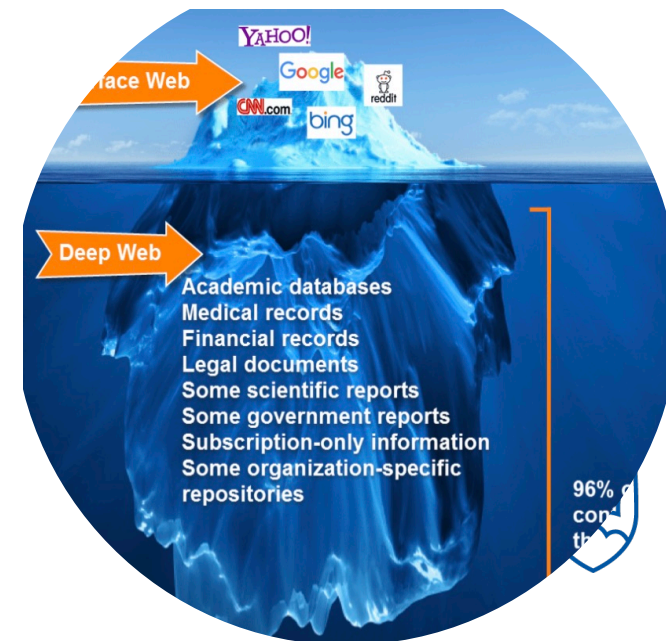

Sprístupnenie služieb

Digitálna inklúzia

Digitálna inklúzia

Projekt uľahčuje prístup znevýhodnených skupín
k **digitálnemu obsahu a digitálnym službám**,

Existujúci digitálny
obsah



Nový digitálny
obsah



Sprístupnenie
digitálnej služby



Digitálna inklúzia

Projekt rieši oblasť asistovaného života a telemedicíny k cieľovej skupine,

Miera odkázanosti
I. – III.



Miera odkázanosti
IV. - VI



Digitálna inklúzia

Početnosť cieľovej skupiny projektu

20
používateľov




40
používateľov



80
používateľov



200
používateľov



200+
používateľov



Digitálna inklúzia

Charakter technologického riešenia opatrení asistovaného života a telemedicíny

Jednosmerná
komunikácia



Obojsmerná
komunikácia



Signál



Hlas



Video





Rozhodovanie podľa use case Surové a spracované údaje Spoločné dátové modely

Lepšie spracovanie údajov

Lepšie spracovanie údajov

Príspevok projektu k lepšiemu využitiu dát,


Rozhodovanie na
základe údajov



Sprístupňuje nové
údaje



Sprístupňuje
analytické modely



Zverejnené vo
forme open data



Lepšie spracovanie údajov

Posúdenie očakávaného efektu navrhovaných
opatrení

Zefektívnenie
procesov



Zvýšenie
dôveryhodnosti



Rast dátovej
ekonomiky



Zvyšovanie
spotrebiteľskej
hodnoty



Úspora
verejných
výdavkov



Kybernetická bezpečnosť

Zvýšenie úrovne zavedených postupov a opatrení
týkajúcich sa kybernetickej a informačnej bezpečnosti v
subjektoch verejnej správy v podsektore IS VS

zvýšenie ochrany
pred útokmi z
externého prostredia

zvýšenie schopnosti
detekcie škodlivých
aktivít, a
bezpečnostných
incidentov

ochrana dát,
dátových prenosov
a komunikácie

budovanie
bezpečnostného
povedomia
